




RAPORT

privind progresul implementării Programului Operațional Regional Centru 2022-2024

Perioada de raportare
ianuarie – iunie 2023

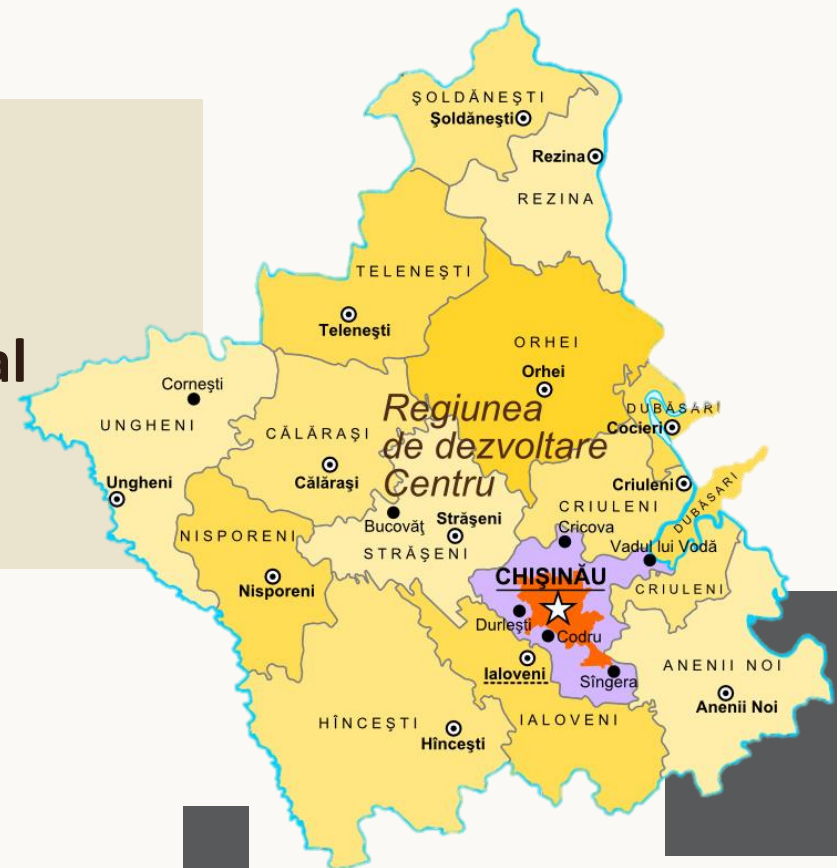



CUPRINS:

1.1 Direcția prioritară

Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creștere a competitivității Regiunii de Dezvoltare Centru

1.3 Direcția prioritară

Identificarea și promovarea specializării inteligente în RDC

Direcția prioritară

1.2

Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RDC – sporirea atractivității turistice

Direcția prioritară

1.4

Cooperarea regională și transfrontalieră



CUPRINS:

2.1 Direcția prioritară

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-
edilitare de bază la nivelul RDC

3.1 Direcția prioritară

Eficientizarea operațională a
procesului de implementare a
politicii de dezvoltare regională

Direcția prioritară

2.3

Sprijinirea procesului de adaptare a RDC la
schimbările climatice, prevenirea riscurilor și
reziliența în fața dezastrelor


Direcția prioritară

3.3

Dezvoltarea de capacități ale APL-
lor din regiune în domenii
relevante politicii de dezvoltare
regională



Direcția 1.1 Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creștere a competitivității Regiunii de Dezvoltare Centru - Concursul de propuneri de proiecte

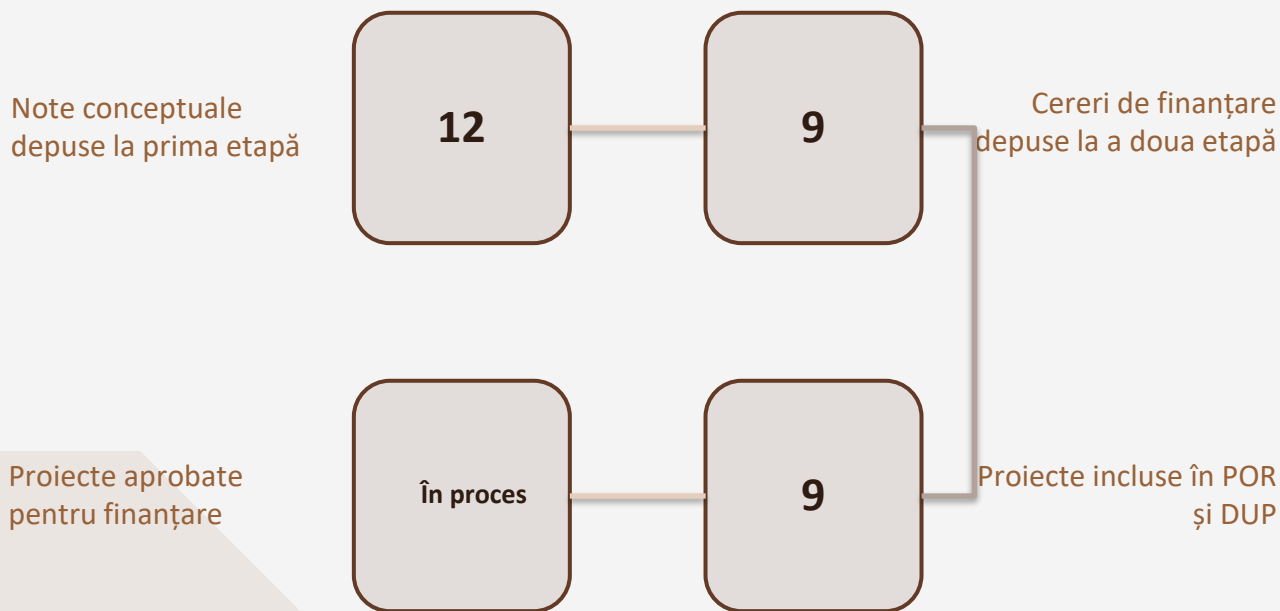



Proiect: Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni



Contractat - 10 767 808,31 lei

Valorificat - 590 060, 07 lei – 5.5%

Perioada de implementare:

26.09.2022 – 15.01.2024





Direcția prioritară 1.2 Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RDC – sporirea atractivității turistice



Direcția prioritară 1.3

Identificarea și promovarea specializării inteligente în RDC

A fost inițiată elaborarea unui studiu regional cu privire la specializarea inteligentă în RDC.

Studiul de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova

Elaborat de:
Agenția de Dezvoltare Regională Centru



Direcția prioritară 1.4

Cooperarea regională și transfrontalieră



01

Organizarea Evenimentului regional cu genericul „Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova” – 12 mai 2023.

02

Participare în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare (CCM) a Programului Operațional Comun România–Republica Moldova 2014-2020 – participarea la 1 ședință și 35 documente consultate.

03

Participare în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare (CCM) a Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021-2027 - participarea la 1 ședință și 49 documente consultate.

04

Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.





Direcția prioritară 2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază. Gradul de implementare a proiectelor.



36% 23 258 984,53 lei

Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut - s.Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni

Contractat

63 863 942,38 lei

78% 14 042 995,41 lei

Sisteme regionale „Apa-Canal” – garanția sănătății noastre



Contractat

14 042 995,41 lei



5% 1 694 325,18 lei

Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești

Contractat

30 602 257,87 lei

30% 19 769 425,32 lei

Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hîncești, et I.



Contractat

19 769 425,32 lei



Direcția prioritară 2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază. Gradul de implementare a proiectelor.



32% 10 151 666,34 lei

Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare

Contractat

34 104 256,25 lei

53% 1 564 800,00 lei

Sistem de canalizare pentru 7 localități



Contractat

2 912 400.00 lei



30% 14 913 943,56 lei


Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și comuna Vărzărești

Contractat

50 926 617,19 lei

100% 1 681 392,00 lei

Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu, (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)



Contractat

1 681 932,00lei

Indicatori realizați:

- 138 cămine de vizită
- 4322 m. de rețele de canalizare construite;
- 1 stație de pompare construită;
- creșterea ratei de acoperire a orașului Rezina, cu servicii de canalizare, cu 7,4%: de la 61%, la 68,4%
- 2000 de locuitori ai orașului informați cu privire la importanța utilizării sistemului de canalizare



Proiectul: "Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare" - **proiect finalizat**





Total contractat:
3 525 004,60 euro

Total valorificat:
834 615,40



Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" Gradul de valorificare a contractelor încheiate.



- **Proiectare** 460 846 euro 23,90%
- **Consultanță** 358 631 euro 23,90%
- **IPOT** – 302 768 lei 16,63%

- Servicii de proiectare Consulting Engineers Salzgitter GmbH 1 928 190 euro;
- Măsuri de consultanță și suport - 1 500 000 euro;
- Servicii cadastrale și evaluare IPOT - Institutul pentru organizarea teritoriului - 1 936 292,00 lei;

Dirrecția prioritară 2.3 Sprijinirea procesului de adaptare a RDC la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor

Proiectul "Sporirea eficienței energetice a liceului teoretic Alexei Mateevici", raionul Șoldănești – în implementare



Buget total -53 983 436,46 lei inclusiv APL 1 300 000,00

Total valorificat - 24 500 082,10 lei


Suprafețe termoizolate -5528, 53 m.p

Planșeu izolat – 745 m.p

Ferestre/uși exterioare schimbate –744 m.p



Fondurile Uniunii Europene în RDC

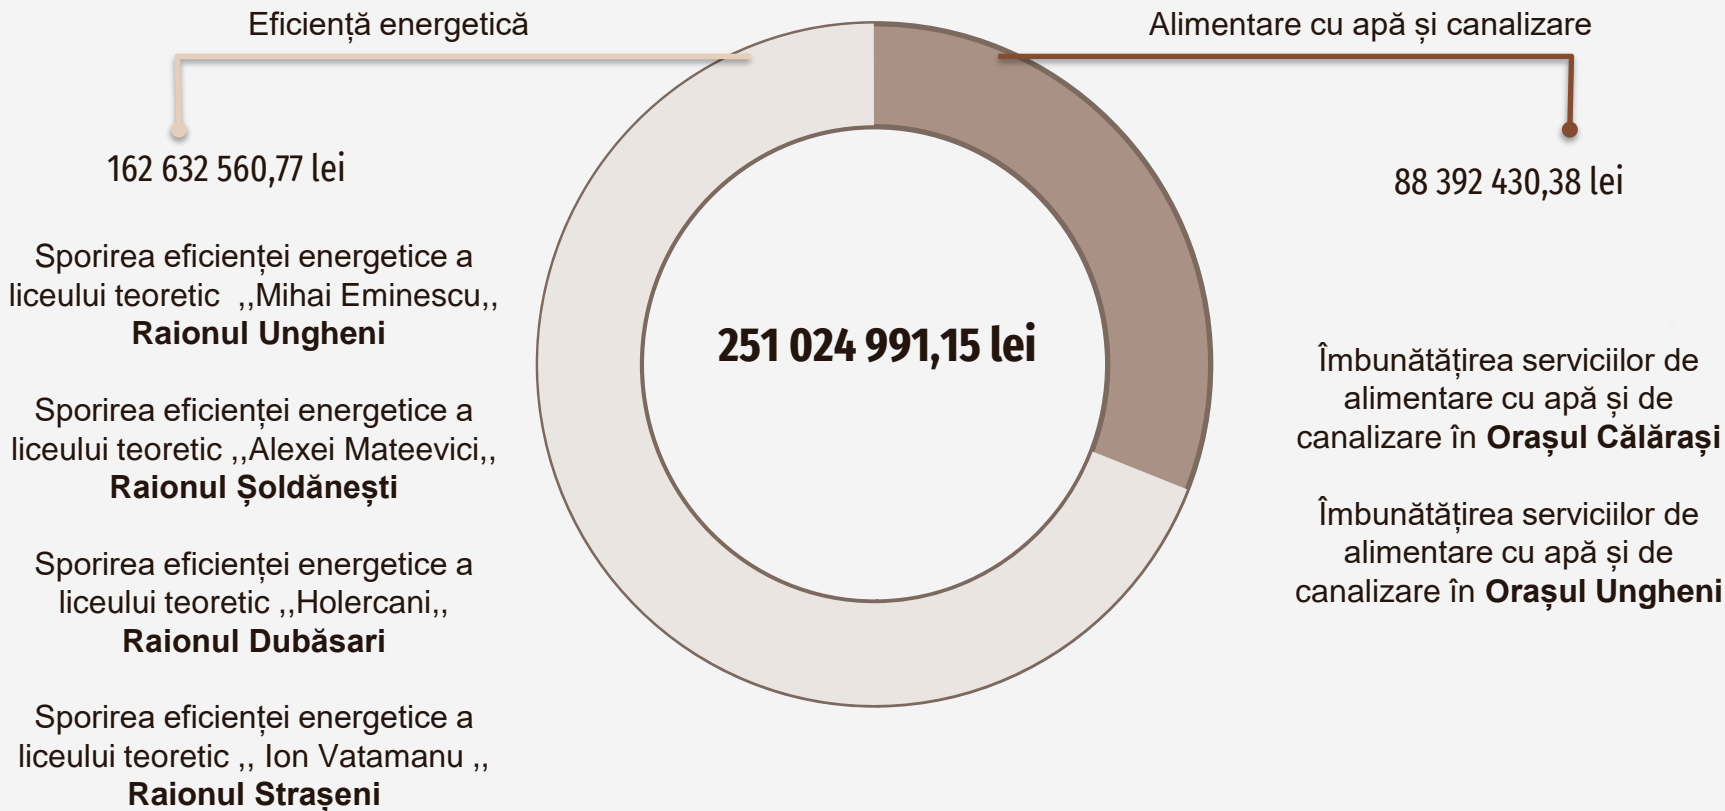



Direcția prioritară 3.1

Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională.



- Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare: Solidarity Fund PL, Ambasada Slovaciei în RM, Ambasada Poloniei în RM;
- - Elaborarea calendarului concursurilor de propuneri de proiecte;
- Efectuarea vizitelor de monitorizare post-implementare a proiectelor – 6 vizite organizate ;
- Elaborarea rapoartelor de impact a proiectelor - 4 rapoarte elaborate;





Direcția prioritară 3.3

Dezvoltarea de capacități ale APL-lor din regiune în domenii relevante politicii de dezvoltare regională.



La data de 08 iunie 2023, fost organizată o Masă rotundă "Concluzii, recomandări și lecții învățate ca urmare a Concursului de propuneri de proiecte,,





Rezultate obținute în realizarea politicii de DR:

Atractivitate turistică



4 proiecte în implementare;

Revitalizare urbană



1 proiect în implementare;

Aprovizionare cu apă și canalizare



- 10 proiecte în proces de implementare;
- 1500 locuitori cu acces la sistem de aprovizionare cu apă construit;
- 11,19 km rețele de canalizare reabilite/construite;
- 63,64 km de rețele de apeduct construite;
- 3 proiecte tehnice elaborate;
- 1 studiu de fezabilitate elaborat;
- 1 procedură de precalificare finalizată –proiectul KfW



81 738 363,12 lei

Suma totală planificată conform
PAF 2023

56 376 306,57 lei

Suma valorificată din toate fondurile
planificate



53 654 256,07 lei

Inclusiv suma valorificată pentru
implementarea proiectelor din DUP
2022-2024
